

00052025 — Reposição de Pavimentos Asfáltico e Granítico nas Zonas Rural e Urbana do Município

Prefeitura Municipal de Guarabira

Finalizada

RESUMO FINANCEIRO

CONTRATADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
R\$ 769.999,98	R\$ 671.046,04	R\$ 671.046,04	R\$ 98.953,94


DADOS GERAIS

Tipo de obra	PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Empresa executora	Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Construcao Civil Ltda. - Me — CNPJ 10465480000110
Protocolo	53624/25
ID GeoObras	5970
Tipo de execução	RECUPERACAO
Dimensão	9810.00 Área Construída (m2)
Endereço	Locais diversos do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB — CEP 58200-000
Coordenadas	-6.853660, -35.491470


CICLO DE VIDA


Início	09/04/2025	Previsão de conclusão	04/04/2026
Entrega contratada	—	Concluída em	01/04/2026
Prazo consumido	99.2% (357/360 dias)		

INICIAL — 06/08/2026



FINAL — 06/08/2026



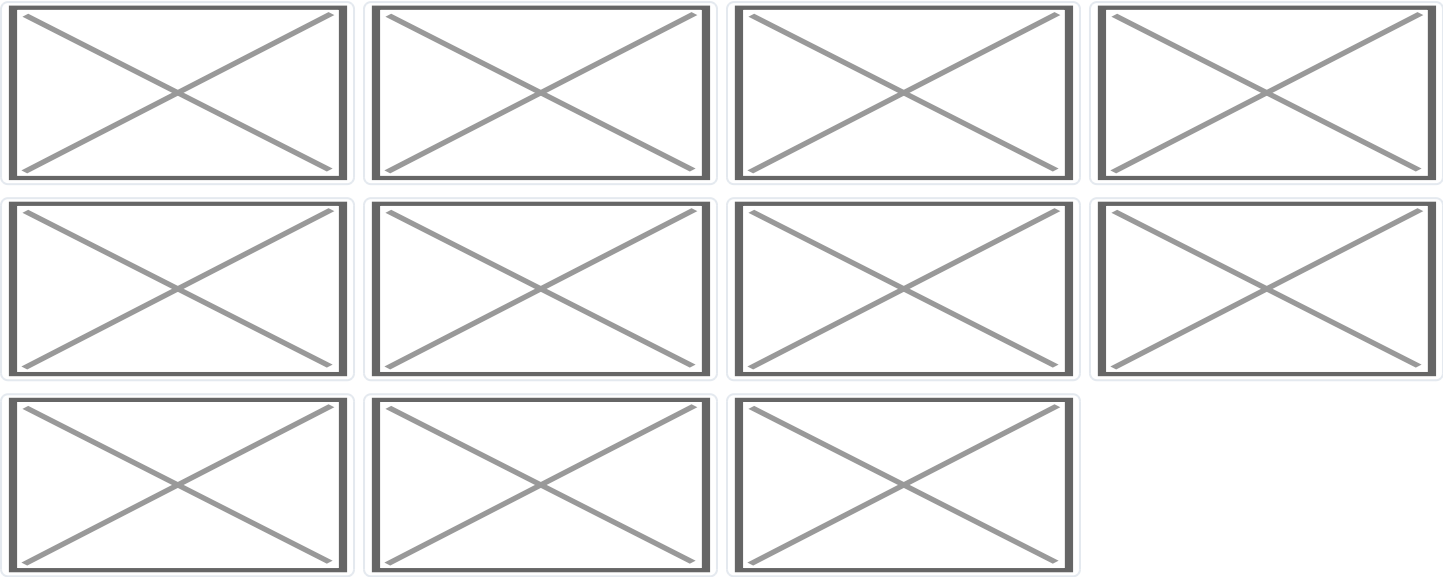

EMPENHOS (8)

Nº	DATA	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	VALOR
4788/2025	20/05/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 144.378,75
7163/2025	27/06/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 0,00
8901/2025	21/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 94.162,89
9032/2025	29/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 105.613,47
12198/2025	12/09/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 150.455,49
15552/2025	04/11/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 68.540,92
2852/2026	06/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 42.573,16
4058/2026	25/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	—	—	R\$ 65.321,36

PAGAMENTOS (26)

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
4788	30/05/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3800/2025.	R\$ 144.378,75

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
7163	01/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5685/2025.	R\$ 0,00
9032	29/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5685/2025.	R\$ 105.613,47
8901	30/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7077/2025.	R\$ 2.354,07
8901	30/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7077/2025.	R\$ 1.129,95
8901	30/07/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 7077/2025.	R\$ 90.678,87
12198	30/09/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9868/2025.	R\$ 1.805,47
12198	30/09/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9868/2025.	R\$ 50.000,00
12198	30/09/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9868/2025.	R\$ 3.761,39
12198	30/09/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 9868/2025.	R\$ 94.888,63
15552	28/11/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.567/2025.	R\$ 822,49

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
15552	28/11/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.567/2025.	R\$ 66.004,91
15552	28/11/2025	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANITICOS E ASFALTICOS ZONAS RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12.567/2025.	R\$ 1.713,52
2852	13/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 370/2025, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMETNOS GRANITICOS E ASFALTICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2183/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 03/2025.	R\$ 40.997,95
2852	13/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 370/2025, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMETNOS GRANITICOS E ASFALTICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2183/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 03/2025.	R\$ 1.064,33
2852	13/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 370/2025, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMETNOS GRANITICOS E ASFALTICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2183/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 03/2025.	R\$ 510,88
4058	31/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 370/2025, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMETNOS GRANITICOS E ASFALTICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3073/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 03/2025.	R\$ 62.904,47
4058	31/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 370/2025, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMETNOS GRANITICOS E ASFALTICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3073/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 03/2025.	R\$ 1.633,03
4058	31/03/2026	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL L	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 370/2025, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMETNOS GRANITICOS E ASFALTICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3073/2026, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 03/2025.	R\$ 783,86
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

Nº	DATA	CREDOR	BANCO	VALOR
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00
—	—	—	—	R\$ 0,00

CONTRATOS E ADITIVOS (1)

Contrato 000003702025 — Protocolo Documento 48512/25

R\$ 769.999,98 (final: R\$ 820.281,25)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENETE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS GRANÍTICOS E ASFÁLTICOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.

Emprotec - Empresa de Projetos Tecnicos E Construcao Civil Ltda. - Me — CNPJ 10465480000110 — assinado em 13/02/2025

001 · Valor · Protocolo Documento 37171/26 — + **R\$ 50.281,27**

Acréscimo de quantitativos dos serviços de Pavimentação Asfáltica executados nos bairros Novo e Nordeste.

CONVÊNIOS

Valor do convênio	R\$ 0,00
Contrapartida municipal	R\$ 0,00
Administração direta	R\$ 0,00
